

FASE XX => uitvoering in WRM
 Parkeervakken De Kastanje
 *Géén werkzaamheden tenzij combineren met fase 2 mogelijk is

FASE XXX => uitvoering in WRM
 Bovenste nieuwe parkeercoffer
 *Géén werkzaamheden m.u.v. opnemen riool incl. tijdelijk dichtstraten


FASE 2
 DWA aansluitingen De Kastanje
 *incl. afsluiting/omleiding De Kastanje

FASE 3
 T.b.v. nieuwbouw

FASE 1
 DWA aansluitingen Kerkstraat
 *incl. afsluiting/omleiding Kerkstraat
 *incl. realisatie locatie tijdelijk containers
 *incl. verplaatsen containers

FASE X => uitvoering in WRM
 Onderste nieuwe parkeercoffer
 *Géén werkzaamheden m.u.v. e.v.t. uitlegger (vooraf opgezocht)

FASE XXXX. => uitvoering in WRM
 Ondergrondse containers Kerkstraat
 *Géén werkzaamheden

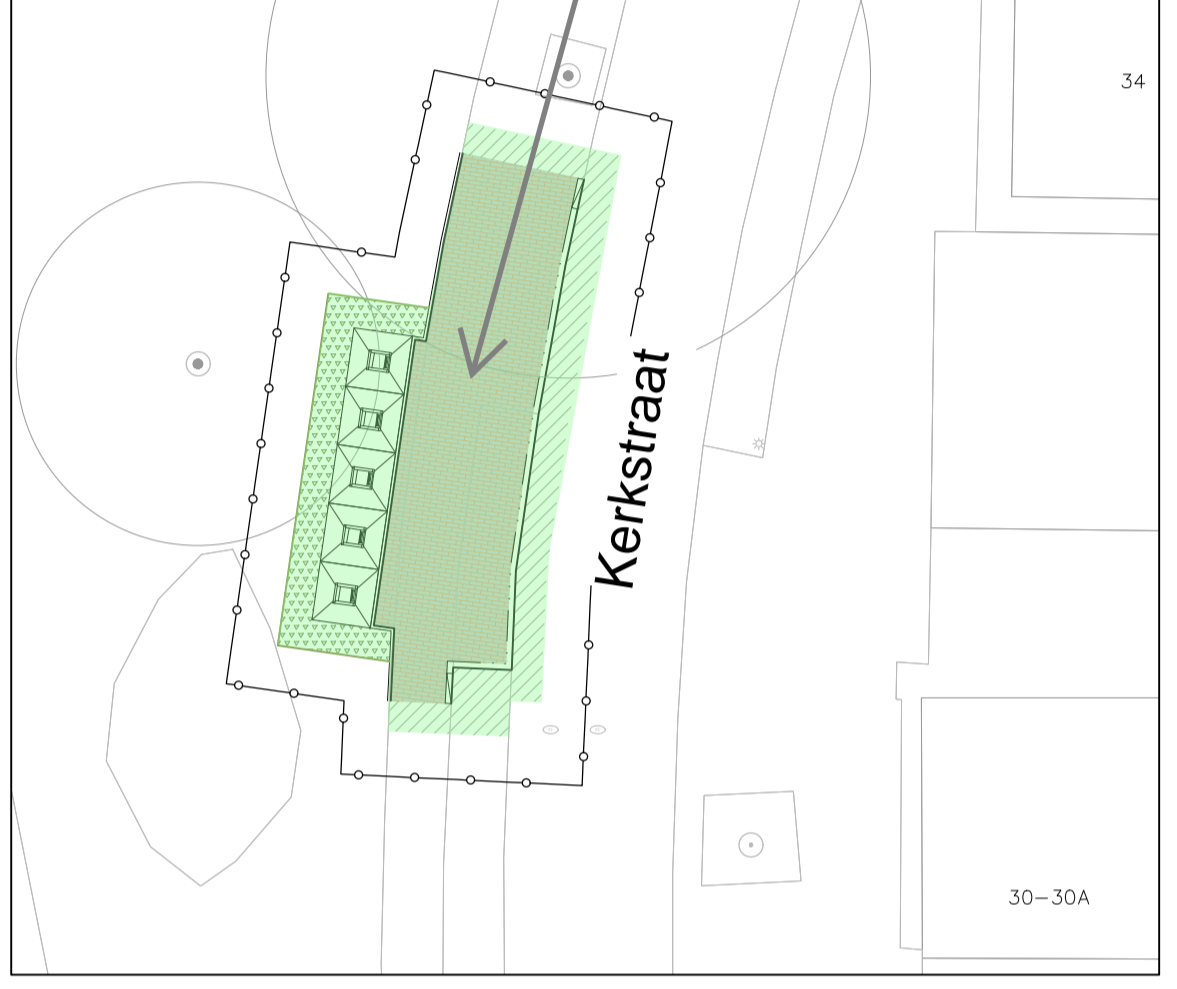

FASERING WRM

WRM uiterlijk woensdag 19-06-2024 gereed (week 25)
 NUTS start week 25 met kabels en leidingen
 Klomps start week 28 met de heipalen

Fase 1 wk 20 ■
 3 DWA aansluitingen in de Kerkstraat

Fase 2 wk 21 ■
 3 DWA aansluitingen in de De Kastanje
 incl. plaatsen overzet put

Fase 3 wk 20 t/m 23 ■
 T.b.v. nieuwbouw

1) Wk 20 opnemen parkeerplaats, fundering
 en een deel van het bestaand HWA en DWA riool

2) Wk 21 Algemeen grondwerk
 t.b.v. bouwkavels incl. grondwerk t.b.v. nutsstroken
 *maandag vrij i.v.m. pinksteren


3) Wk 22 Aanleg nieuw DWA hoofdriool t.b.v.
 nieuwbouw incl. resterende 11 DWA uitleggers

4) Wk 23 Afronden grondwerk terrein
 t.b.v. bouwkavels incl. grondwerk t.b.v. nutsstroken

5) Wk 24 Buffer planning / uitloop grondwerk

Fase X t/m XXXX uitvoering WRM n.t.b.
 géén werkzaamheden t.z. anders vermeld



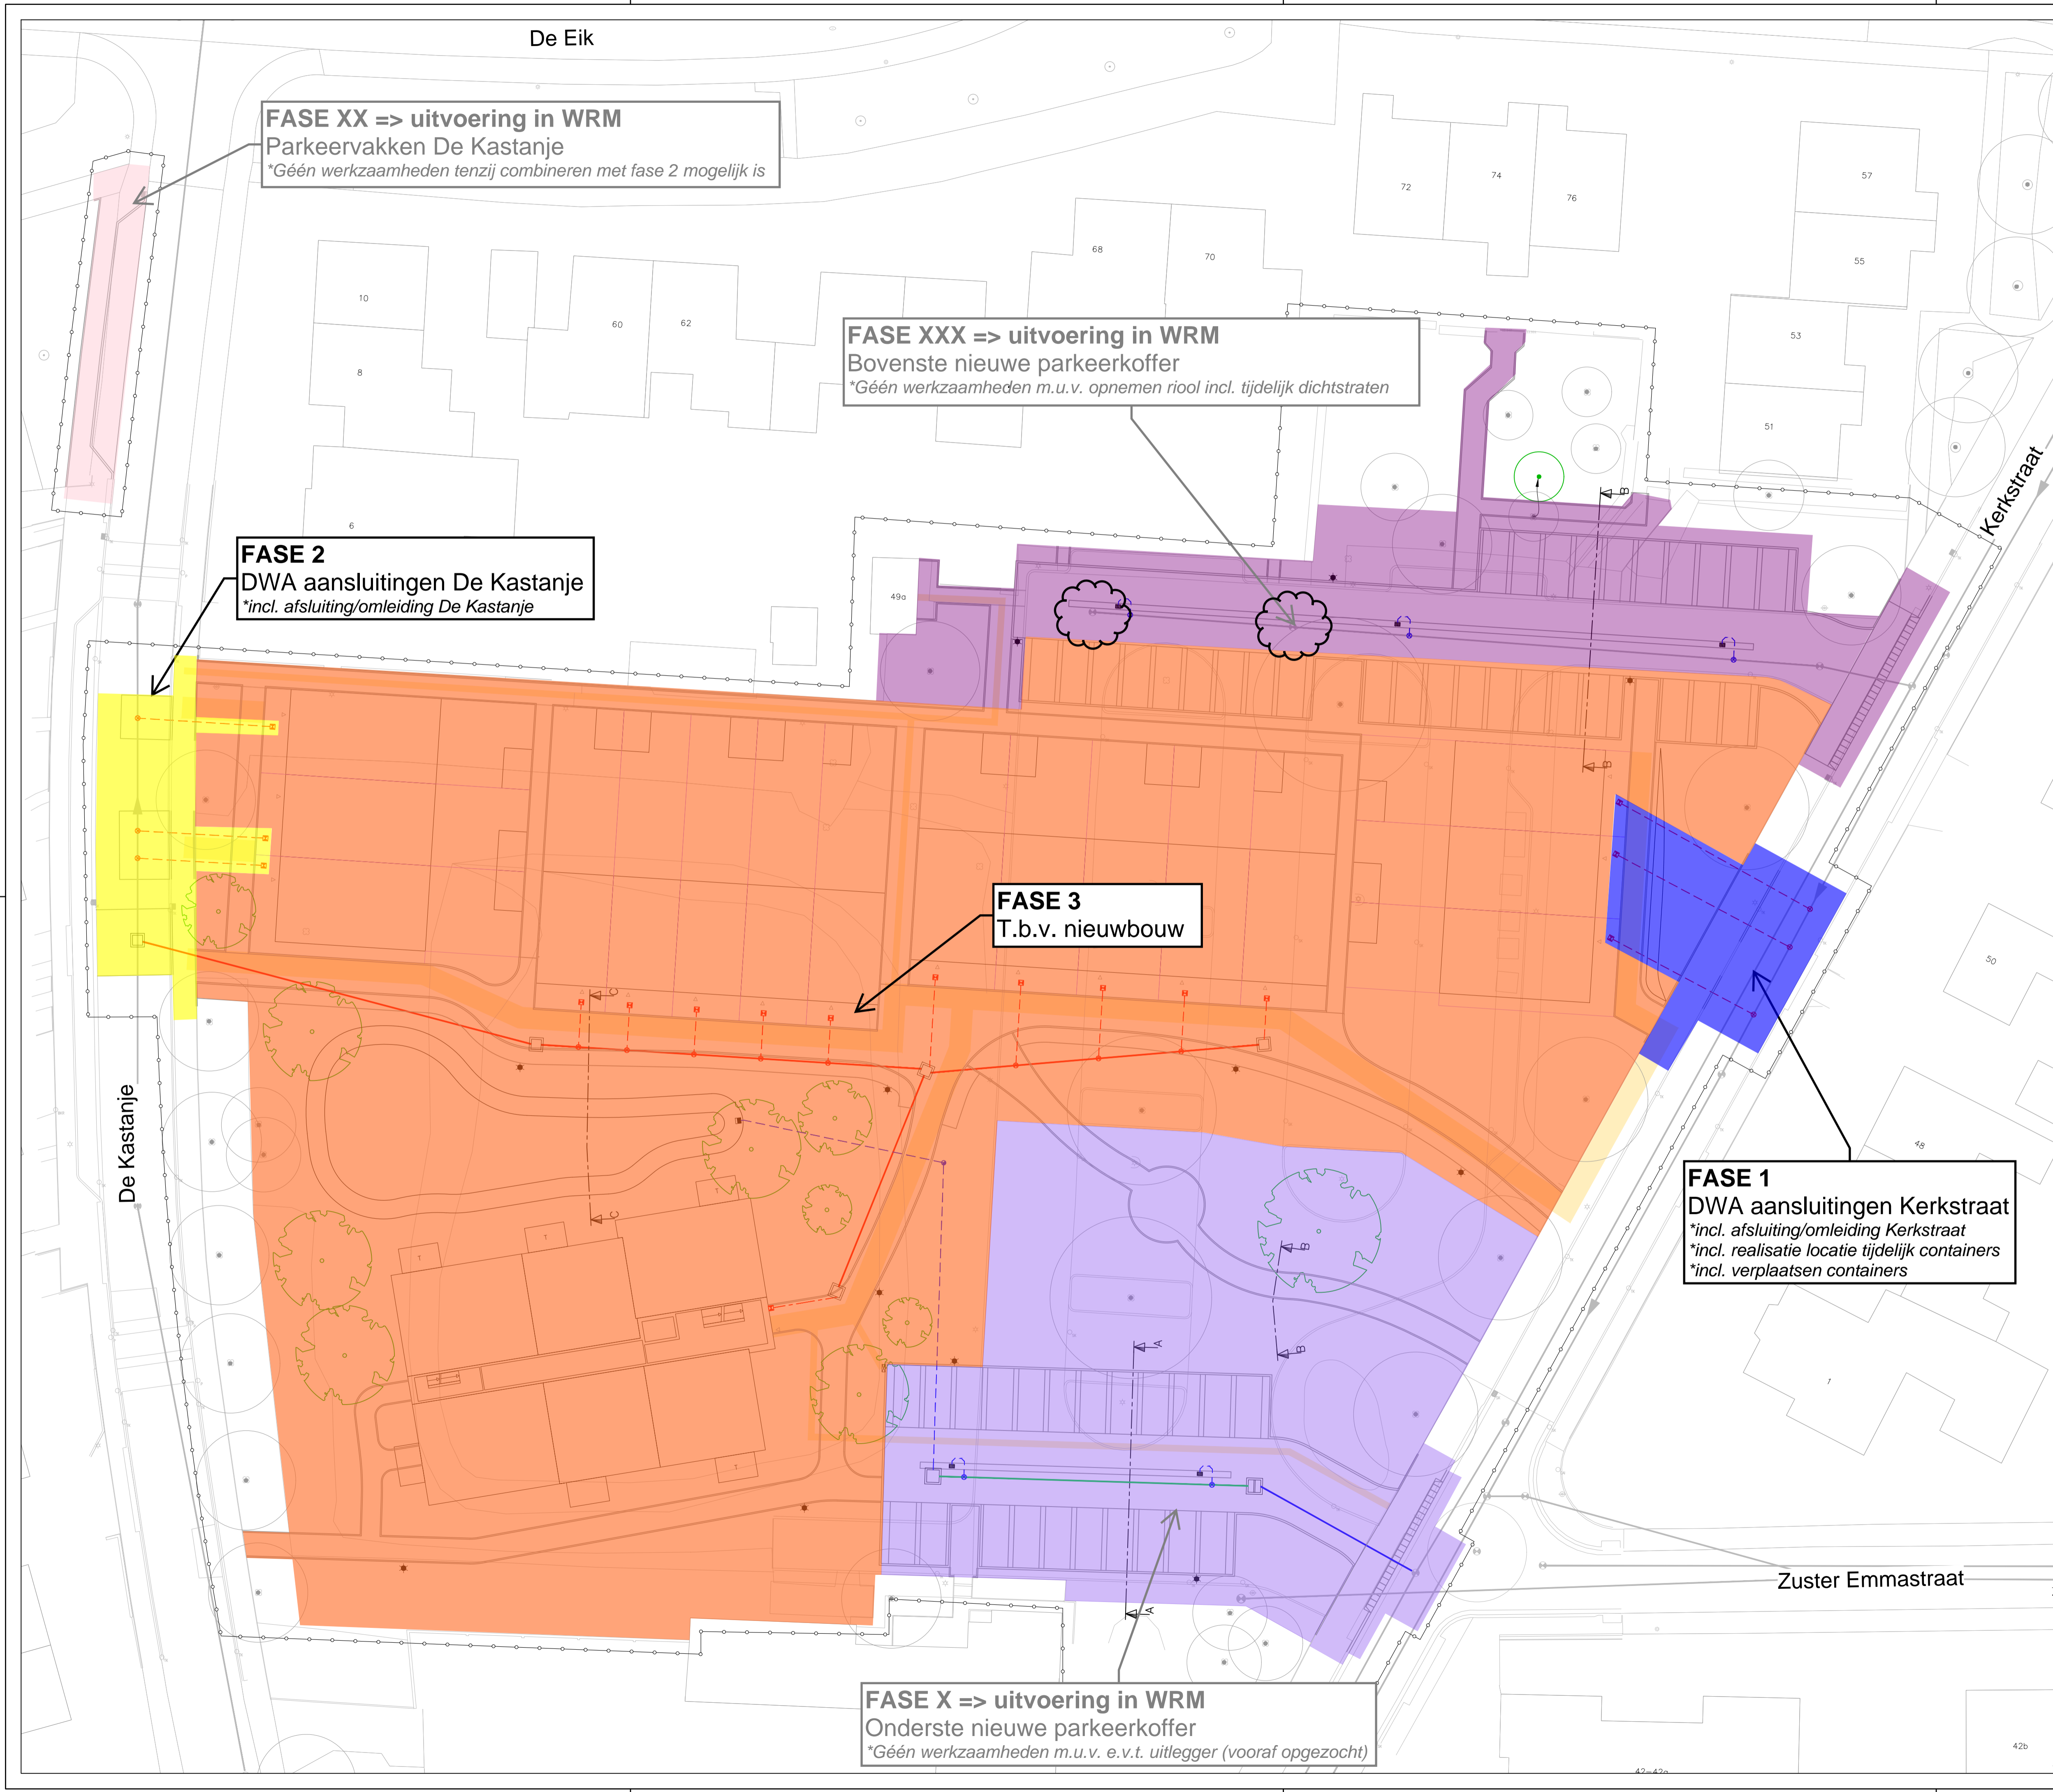

FASE XX => uitvoering in WRM
 Parkeervakken De Kastanje
**Géén werkzaamheden tenzij combineren met fase 2 mogelijk is*

FASE XXX => uitvoering in WRM
 Bovenste nieuwe parkeercoffer
**Géén werkzaamheden m.u.v. opnemen riool incl. tijdelijk dichtstraten*


FASE 2
 DWA aansluitingen De Kastanje
**incl. afsluiting/omleiding De Kastanje*

FASE 3
 T.b.v. nieuwbouw

FASE 1
 DWA aansluitingen Kerkstraat
**incl. afsluiting/omleiding Kerkstraat*
**incl. realisatie locatie tijdelijk containers*
**incl. verplaatsen containers*

FASE X => uitvoering in WRM
 Onderste nieuwe parkeercoffer
**Géén werkzaamheden m.u.v. e.v.t. uitlegger (vooraf opgezocht)*

FASE XXXX. => uitvoering in WRM
 Ondergrondse containers Kerkstraat
**Géén werkzaamheden*

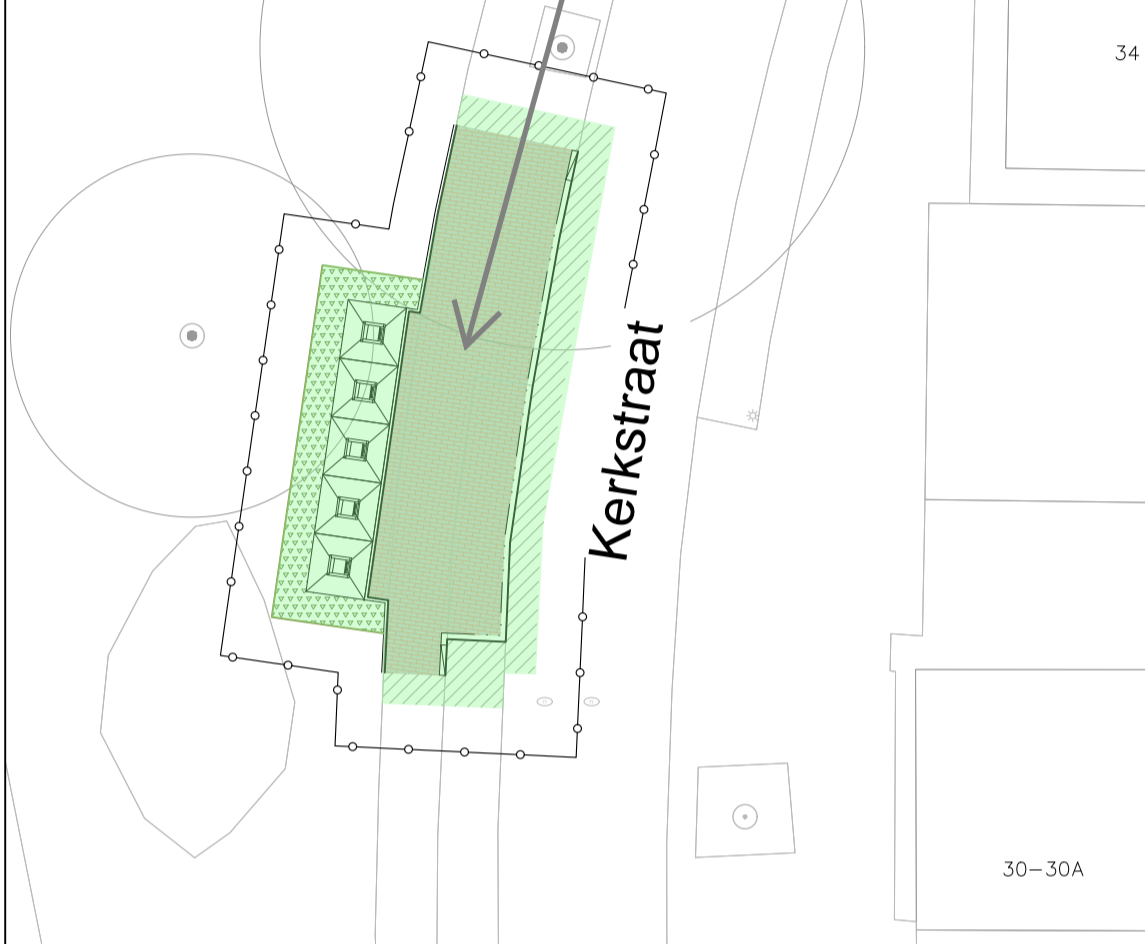

FASERING WRM

WRM uiterlijk woensdag 19-06-2024 gereed (week 25)
 NUTS start week 25 met kabels en leidingen
 Klomps start week 28 met de heipalen

Fase 1 wk 20 ■
 3 DWA aansluitingen in de Kerkstraat

Fase 2 wk 21 ■
 3 DWA aansluitingen in de De Kastanje
 incl. plaatsen overzet put

Fase 3 wk 20 t/m 23 ■
 T.b.v. nieuwbouw

1) Wk 20 opnemen parkeerplaats, fundering
 en een deel van het bestaand HWA en DWA riool

2) Wk 21 Algemeen grondwerk
 t.b.v. bouwkavels incl. grondwerk t.b.v. nutsstroken
**maandag vrij i.v.m. pinksteren*


3) Wk 22 Aanleg nieuw DWA hoofdriool t.b.v.
 nieuwbouw incl. resterende 11 DWA uitleggers

4) Wk 23 Afronden grondwerk terrein
 t.b.v. bouwkavels incl. grondwerk t.b.v. nutsstroken

5) Wk 24 Buffer planning / uitloop grondwerk

Fase X t/m XXXX uitvoering WRM n.t.b.
 géén werkzaamheden t.z. anders vermeld



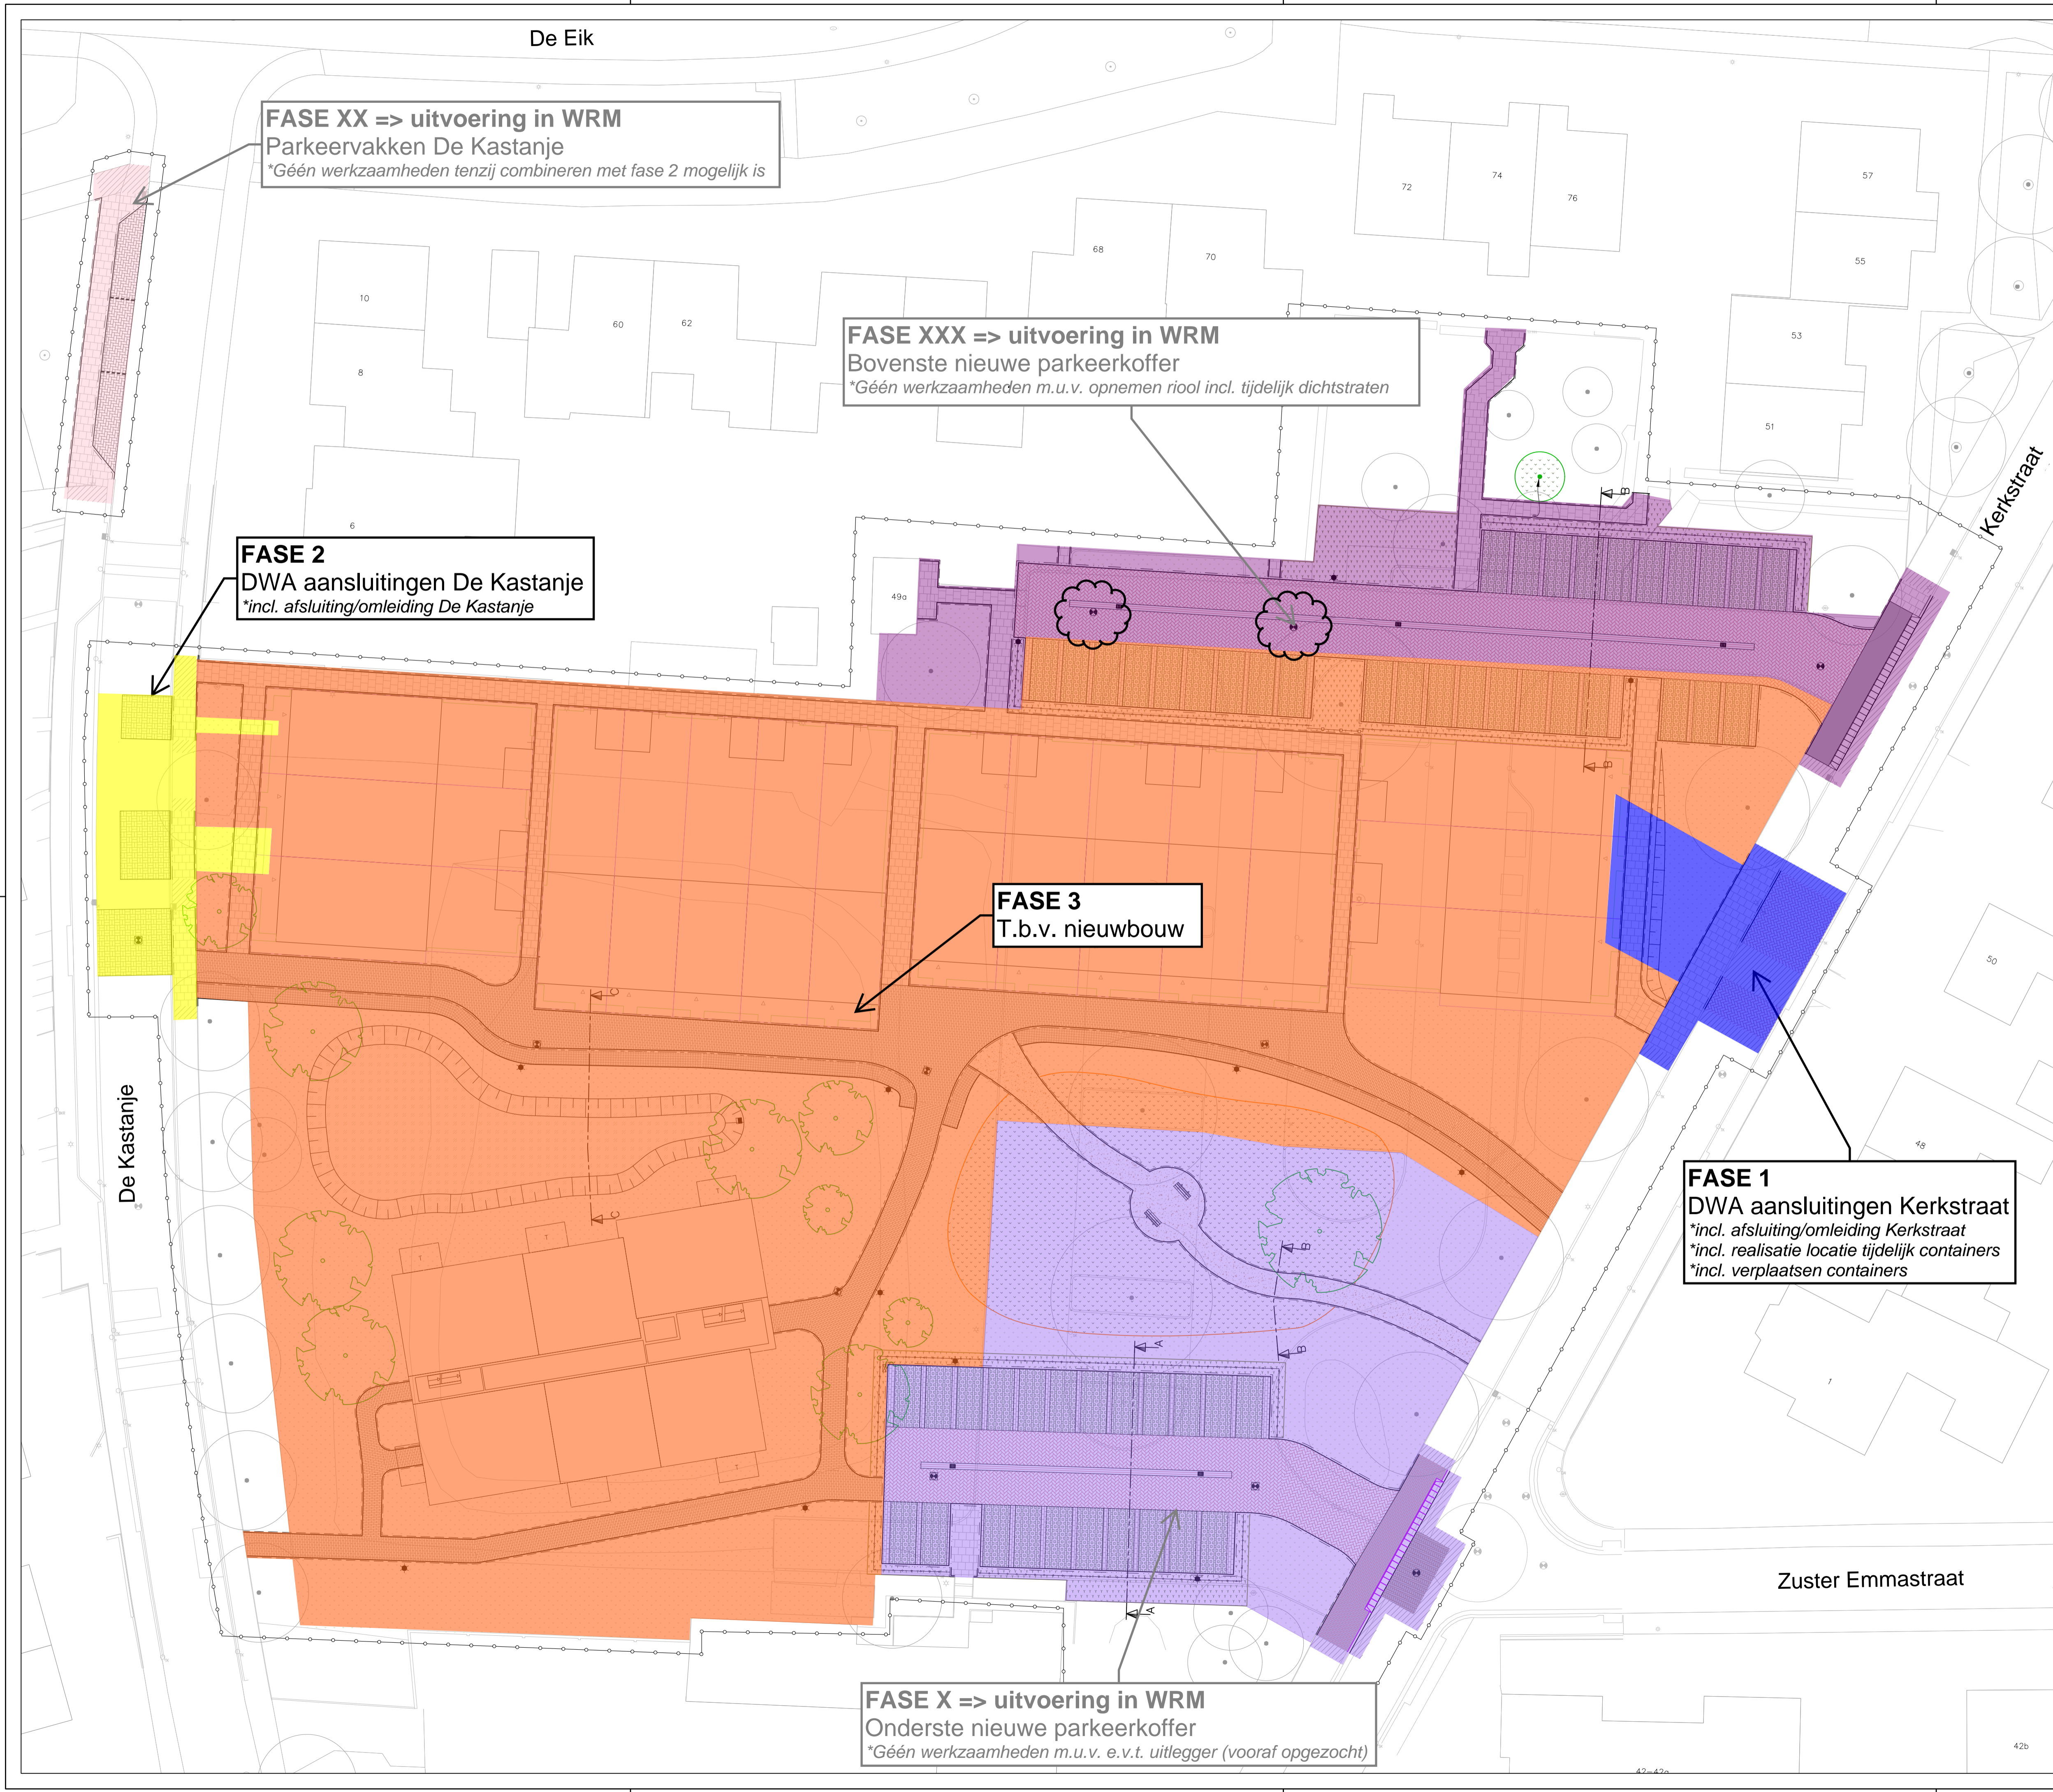

FASE XX => uitvoering in WRM
 Parkeervakken De Kastanje
**Géén werkzaamheden tenzij combineren met fase 2 mogelijk is*

FASE XXX => uitvoering in WRM
 Bovenste nieuwe parkeercoffer
**Géén werkzaamheden m.u.v. opnemen riool incl. tijdelijk dichtstraten*


FASE 2
 DWA aansluitingen De Kastanje
**incl. afsluiting/omleiding De Kastanje*

FASE 3
 T.b.v. nieuwbouw

FASE 1
 DWA aansluitingen Kerkstraat
**incl. afsluiting/omleiding Kerkstraat*
**incl. realisatie locatie tijdelijk containers*
**incl. verplaatsen containers*

FASE X => uitvoering in WRM
 Onderste nieuwe parkeercoffer
**Géén werkzaamheden m.u.v. e.v.t. uitlegger (vooraf opgezocht)*

FASE XXXX. => uitvoering in WRM
 Ondergrondse containers Kerkstraat
**Géén werkzaamheden*

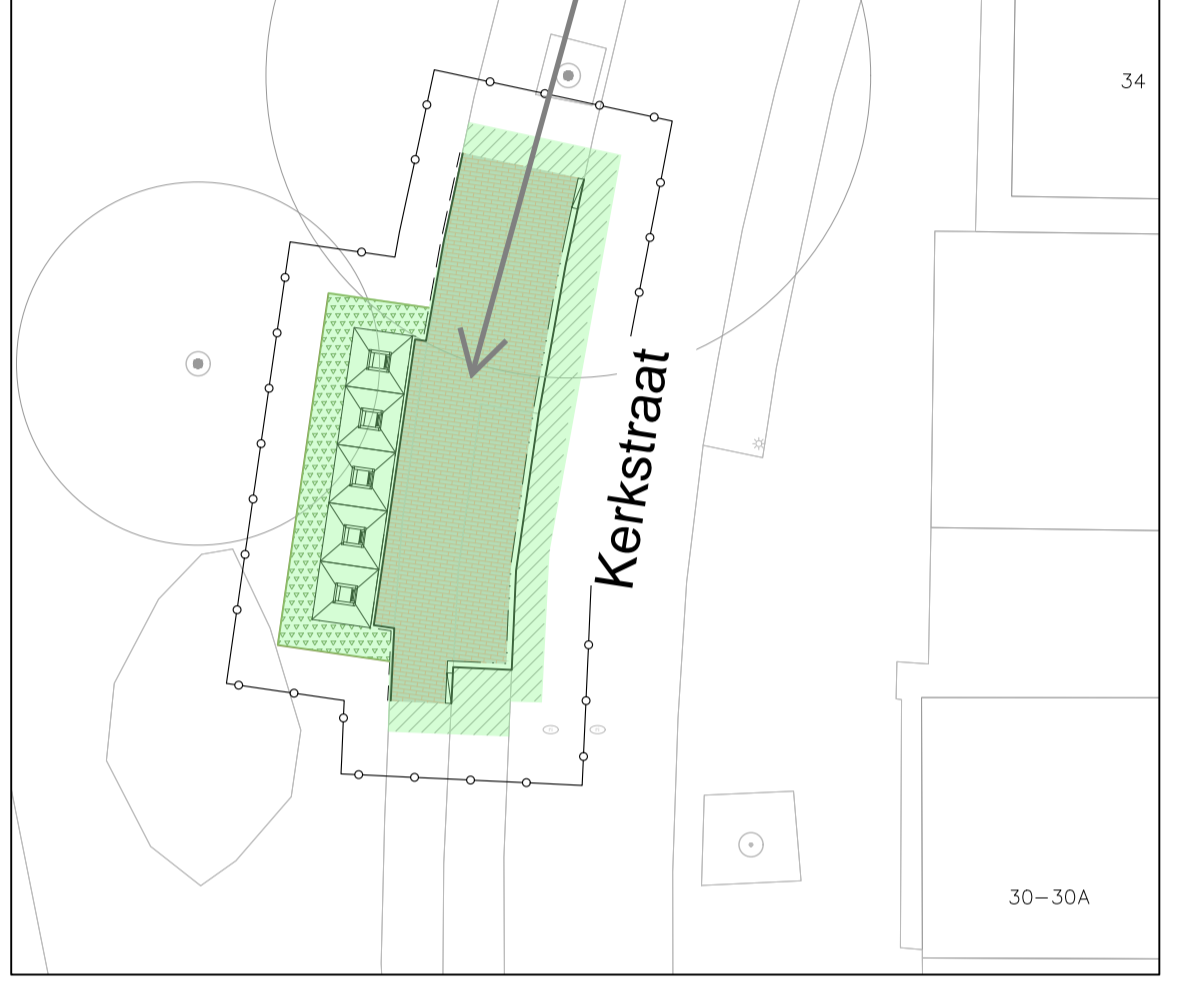

FASERING WRM

WRM uiterlijk woensdag 19-06-2024 gereed (week 25)
 NUTS start week 25 met kabels en leidingen
 Klomps start week 28 met de heipalen

Fase 1 wk 20
 3 DWA aansluitingen in de Kerkstraat

Fase 2 wk 21
 3 DWA aansluitingen in de De Kastanje
 incl. plaatsen overzet put

Fase 3 wk 20 t/m 23
 T.b.v. nieuwbouw

1) Wk 20 opnemen parkeerplaats, fundering
 en een deel van het bestaand HWA en DWA riool

2) Wk 21 Algemeen grondwerk
 t.b.v. bouwkavels incl. grondwerk t.b.v. nutsstroken
**maandag vrij i.v.m. pinksteren*

3) Wk 22 Aanleg nieuw DWA hoofdriool t.b.v.
 nieuwbouw incl. resterende 11 DWA uitleggers

4) Wk 23 Afronden grondwerk terrein
 t.b.v. bouwkavels incl. grondwerk t.b.v. nutsstroken

5) Wk 24 Buffer planning / uitloop grondwerk

Fase X t/m XXXX uitvoering WRM n.t.b.
 géén werkzaamheden t.z. anders vermeld

